


DURATA LAVORI (360 gg naturali e consecutivi)

Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.	SCHEDE LAVORAZIONI
A	Consegna dei lavori	01/01/14	01/01/14	0	
B/1	Preparazione cantiere	01/01/14	06/01/14	5	A05, A07, A08, A09, A10, A12, A19, A20, A22, A23, A24, U20, U21,
1	GABBIONATA SU PALI	06/01/14	15/02/14	40	C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C17, C18, C30
	TRATTO 1				
2	MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI	15/02/14	22/03/14	35	A01, B01, B02, B03, B05, B07, B08, B10, C34, C35,
3	RETI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	22/03/14	21/04/14	30	C36, C37
4	MARCIAPIEDI	21/04/14	11/05/14	20	U5, U6, U7, U8, U9
5	SOVRASTRUTTURE STRADALI	11/05/14	10/06/14	30	U22, U23, U24, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33,
6	SISTEMAZIONE IMMISSIONE VILLA ELCE	10/06/14	20/06/14	10	U22, U23, U24, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33,
7	SEGNALETICA	20/06/14	30/06/14	10	U20, U21
	TRATTO 2				
8	SISTEMAZIONE IMMISSIONE PRESSO RISTORANTE IL PINO	30/06/14	10/07/14	10	U22, U23, U24, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33,
9	MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI	10/07/14	14/08/14	35	A01, B01, B02, B03, B05, B07, B08, B10, C34, C35,
10	RETTIFICA CURVA	14/08/14	23/09/14	40	A01, B01, B02, B03, B05, B07, B08, B10, C34, C35,
11	RETI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	23/09/14	23/10/14	30	C36, C37
12	SOVRASTRUTTURE STRADALI	23/10/14	22/11/14	30	U22, U23, U24, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33,
13	MURO SVINCOLO RIZZACORNO	22/11/14	12/12/14	20	C01, C02, C04, C06, C07, C30, C31, C32, C36, C37, E02, E05, F01, G01, G02, G03, G06, G07, U20, U21
14	SEGNALETICA	12/12/14	22/12/14	10	U20, U21
B/2	Disallestimento cantiere	22/12/14	25/12/14	3	A03, A05, A07, A08, A09, A10, A12, A22, A23, A24, A25, A26
C	Fine lavori	26/12/14	27/12/14	1	

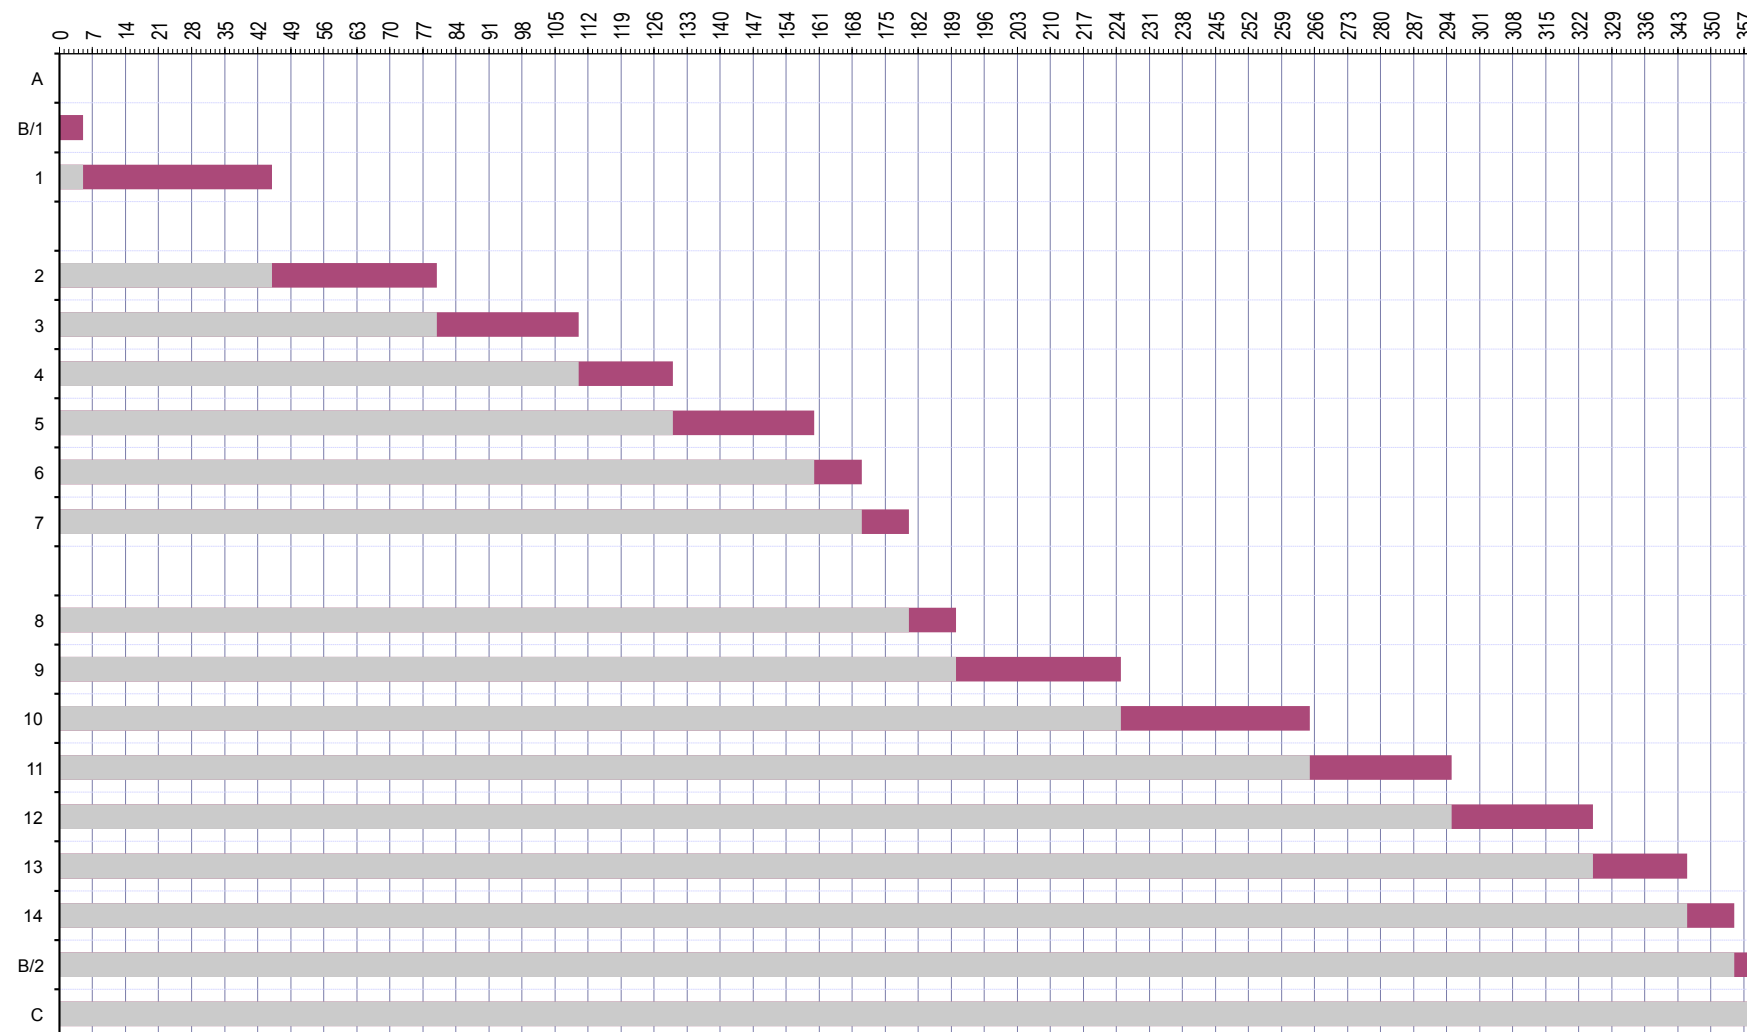

Tempo contrattuale	360	gg naturali e consecutivi
--------------------	------------	---------------------------

Inizio dei lavori	0	gg
-------------------	----------	----

Fine dei lavori	360	gg
-----------------	------------	----
