



# PROVINCIA DI CHIETI

Settore 2 – Funzioni Fondamentali:  
Viabilità, Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

## **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 119 "SANGRITANA"**

Accordo di Programma Quadro "rafforzato" – 1° atto integrativo

**CUP D87H14000730003**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Elaborato

**M.5**

***PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO***

**DIAGRAMMA DI GANTT**

### **I Progettisti**

Ing. Paola CAMPITELLI  
Geom. Piero COCCIA  
Gem. Angelo BOCCHI

### **Il Coordinatore della Sicurezza**

Geom. Giuseppe DI MARINO.....

### **Il Dirigente del Settore Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Carlo CRISTINI .....

Data: ottobre 2015

# ALLEGATO "A"

PROVINCIA DI CHIETI

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Intervento di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.P. n. 119 "SANGRITANA"

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI CHIETI

**CANTIERE:** S.P. 119 "SANGRITANA" , \$Empty\_LAV\_07\$ (\$Empty\_LAV\_08\$)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(GEOMETRA DI MARINO GIUSEPPE)

---

per presa visione  
IL COMMITTENTE  
(ING. CRISTINI CARLO )


---

GEOMETRA DI MARINO GIUSEPPE  
VIA DELLE PIANE , 32  
66019 TORRICELLA PELIGNA (CHIETI )  
0872661341 - \$Empty\_CSP\_10\$  
mgdm@tiscali.it


CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	11 Gen 16			18 Gen 16			25 Gen 16														
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>	24 g	▼																				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g	Z1																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	4 g	Z1																				
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	7 g	Z1																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g	Z1																				
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	3 g	Z1																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g																					
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g																					
<b>DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI</b>	10 g																					
<b>DEMOLIZIONI E TAGLI</b>	10 g																					
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con ir	10 g																					
<b>STRADE</b>	92 g																					
Asportazione di strato di usura e collegamento	7 g																					
Cordoli, zanelle e opere d'arte	18 g																					
Formazione di fondazione stradale	8 g																					
Formazione di manto di usura e collegamento	34 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori	1 g																					
Montaggio di guard-rails	18 g																					
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strac	9 g																					
Realizzazione di marciapiedi	6 g																					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	15 g																					
Formazione di rilevato stradale	7 g																					
<b>FONDAZIONI SPECIALI</b>	44 g																					
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	13 g																					
Perforazioni per pali trivellati	25 g																					
Posa ferri di armatura per pali trivellati	13 g																					
<b>OPERE DI SOSTEGNO</b>	105 g																					
Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.	18 g																					
Posa di gabbionature metalliche	14 g																					
Realizzazione di paratia in c.a.	19 g																					
Smobilizzo del cantiere	7 g																					
<b>LEGENDA Zona:</b>																						



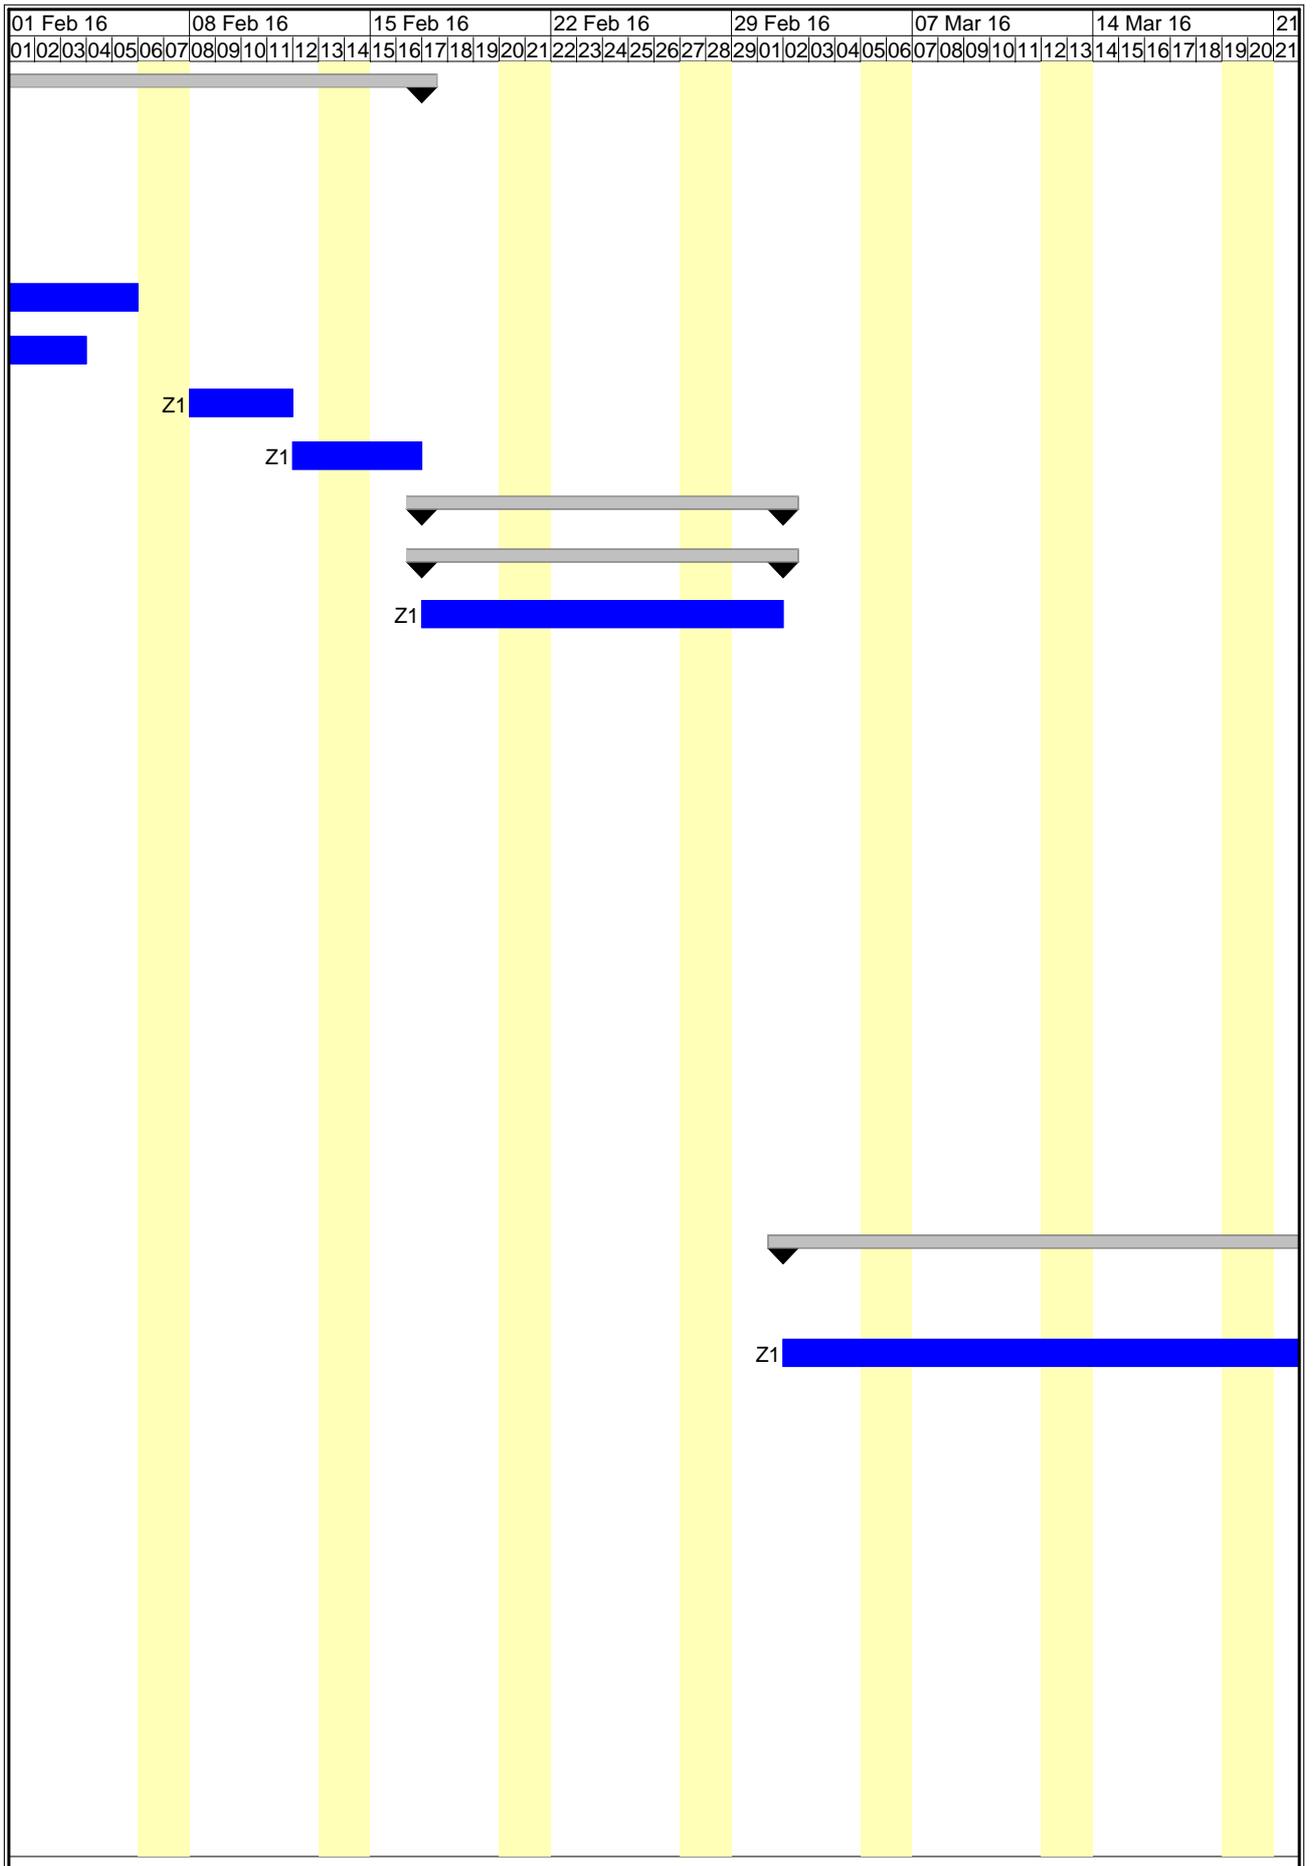




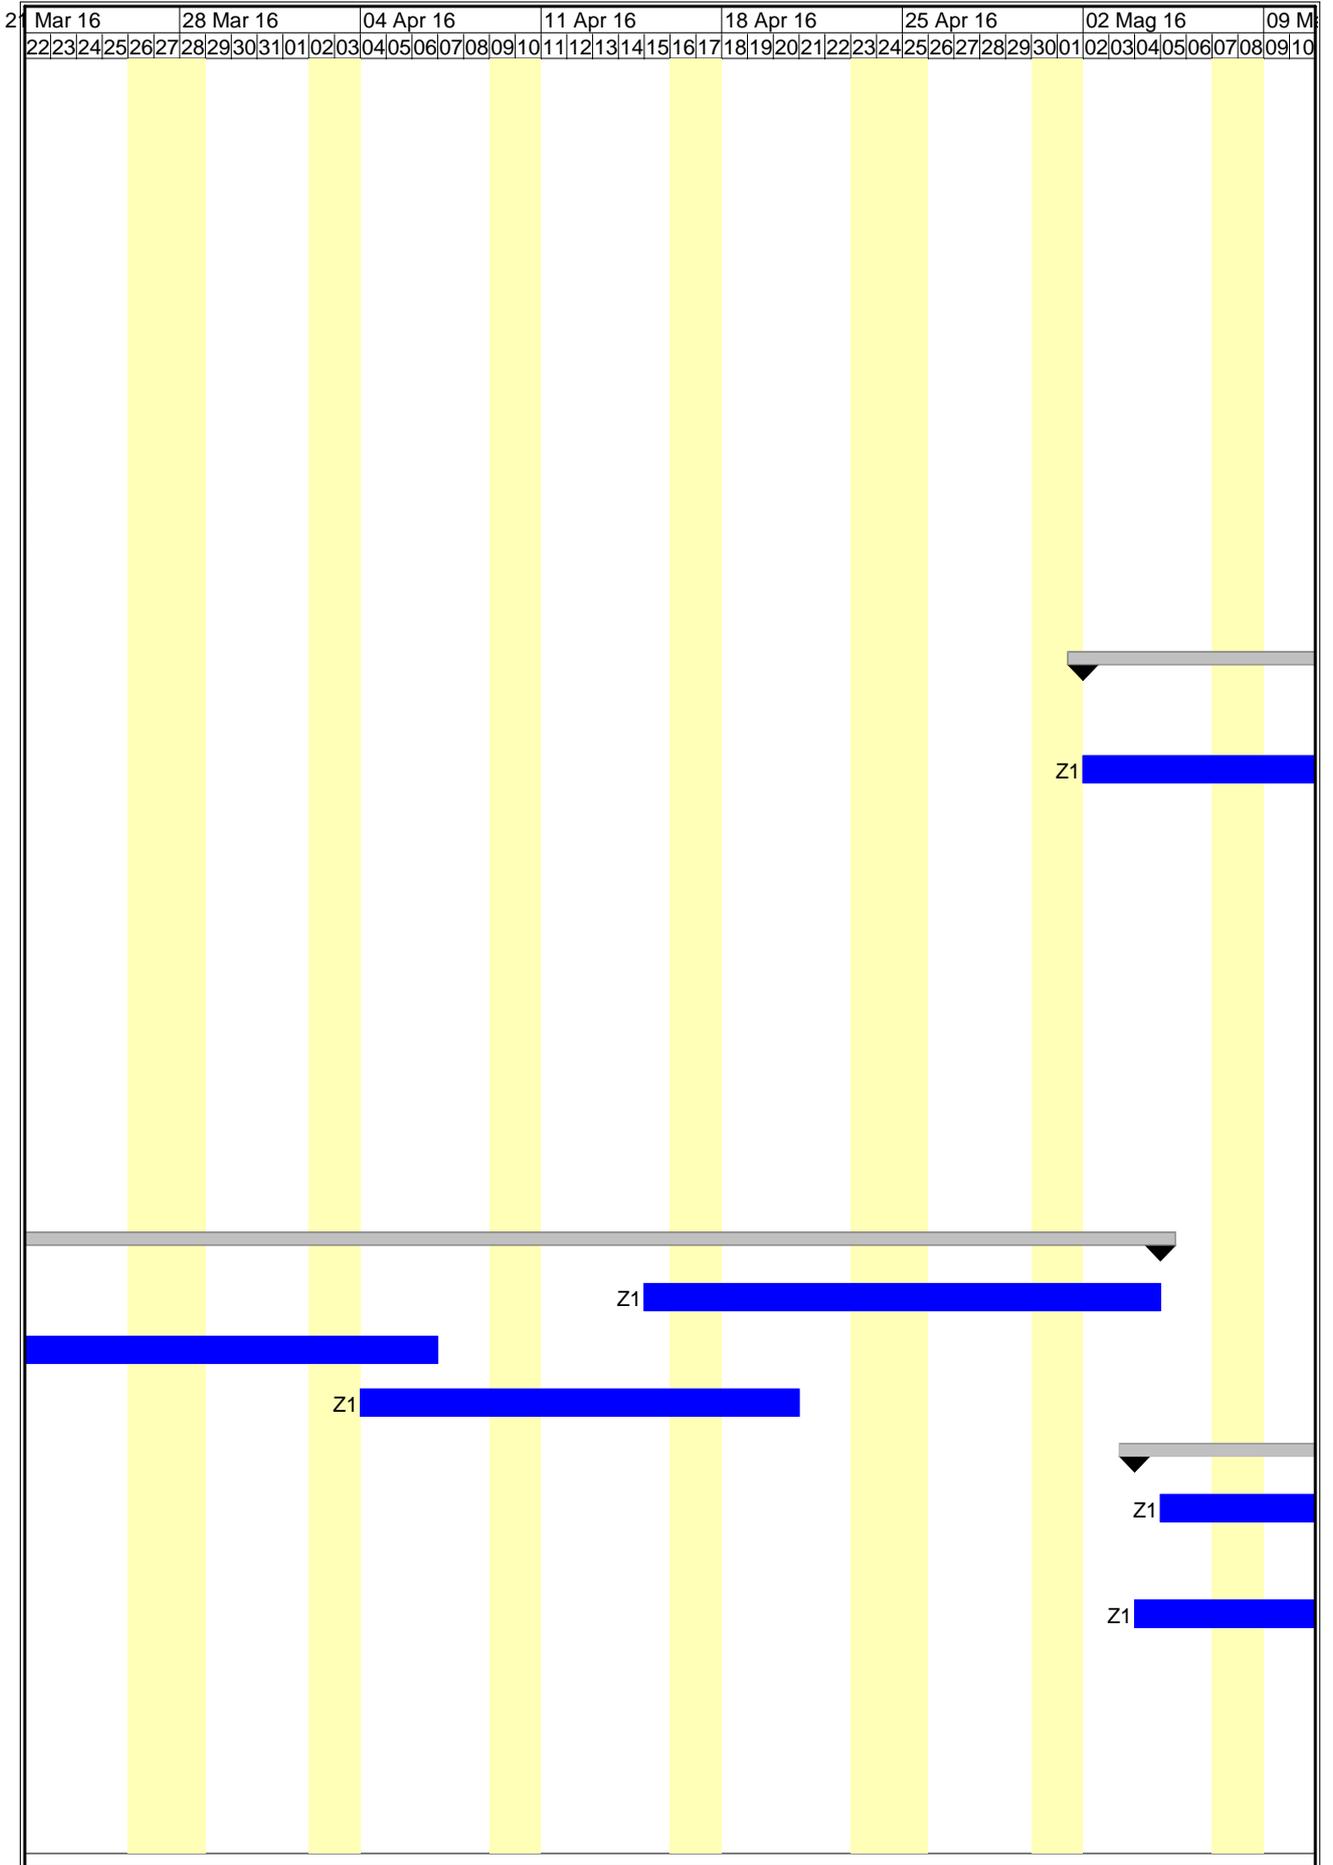








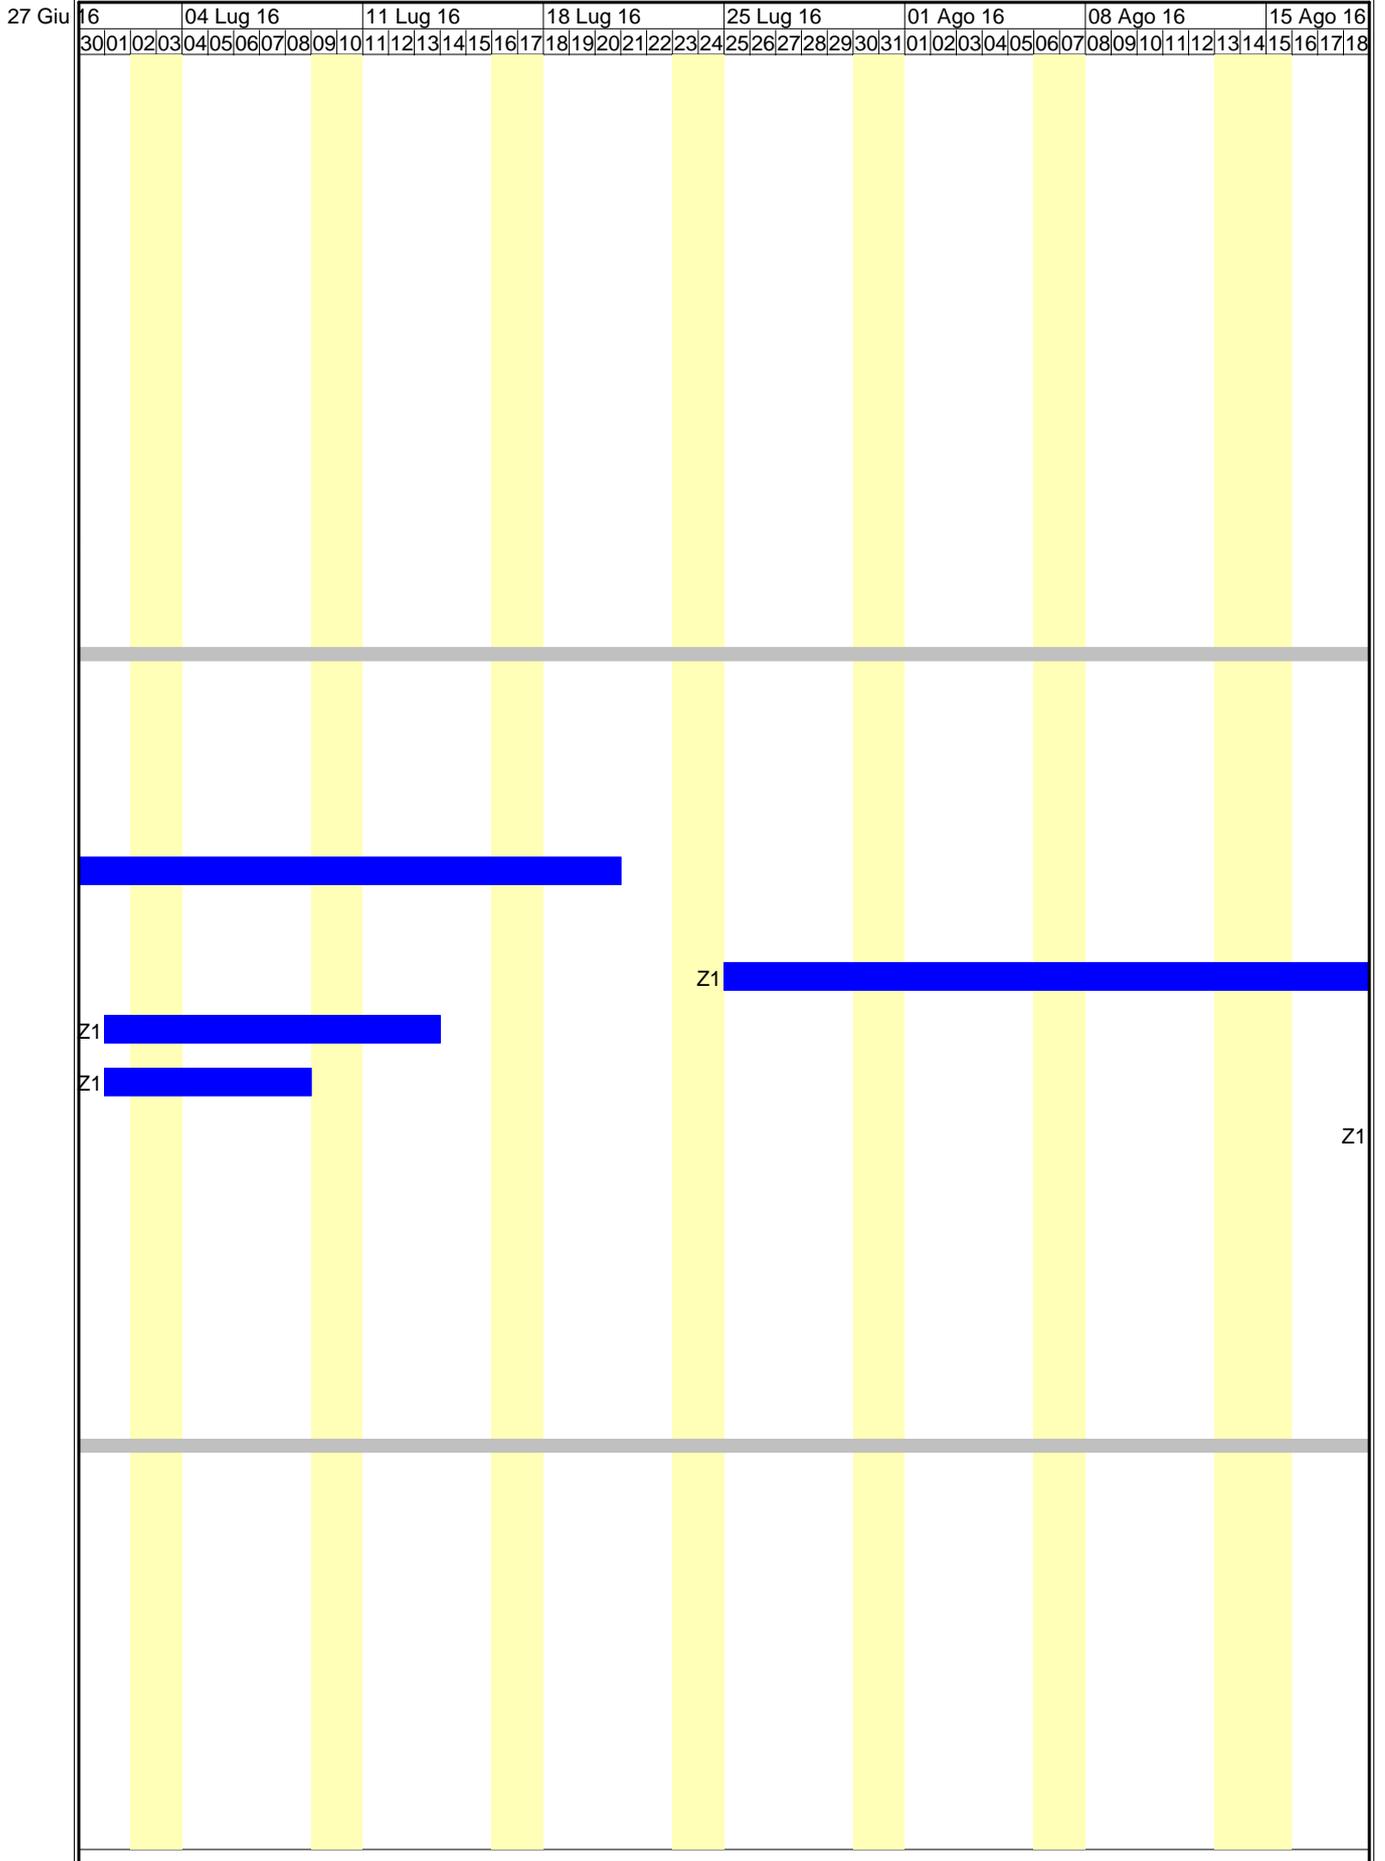



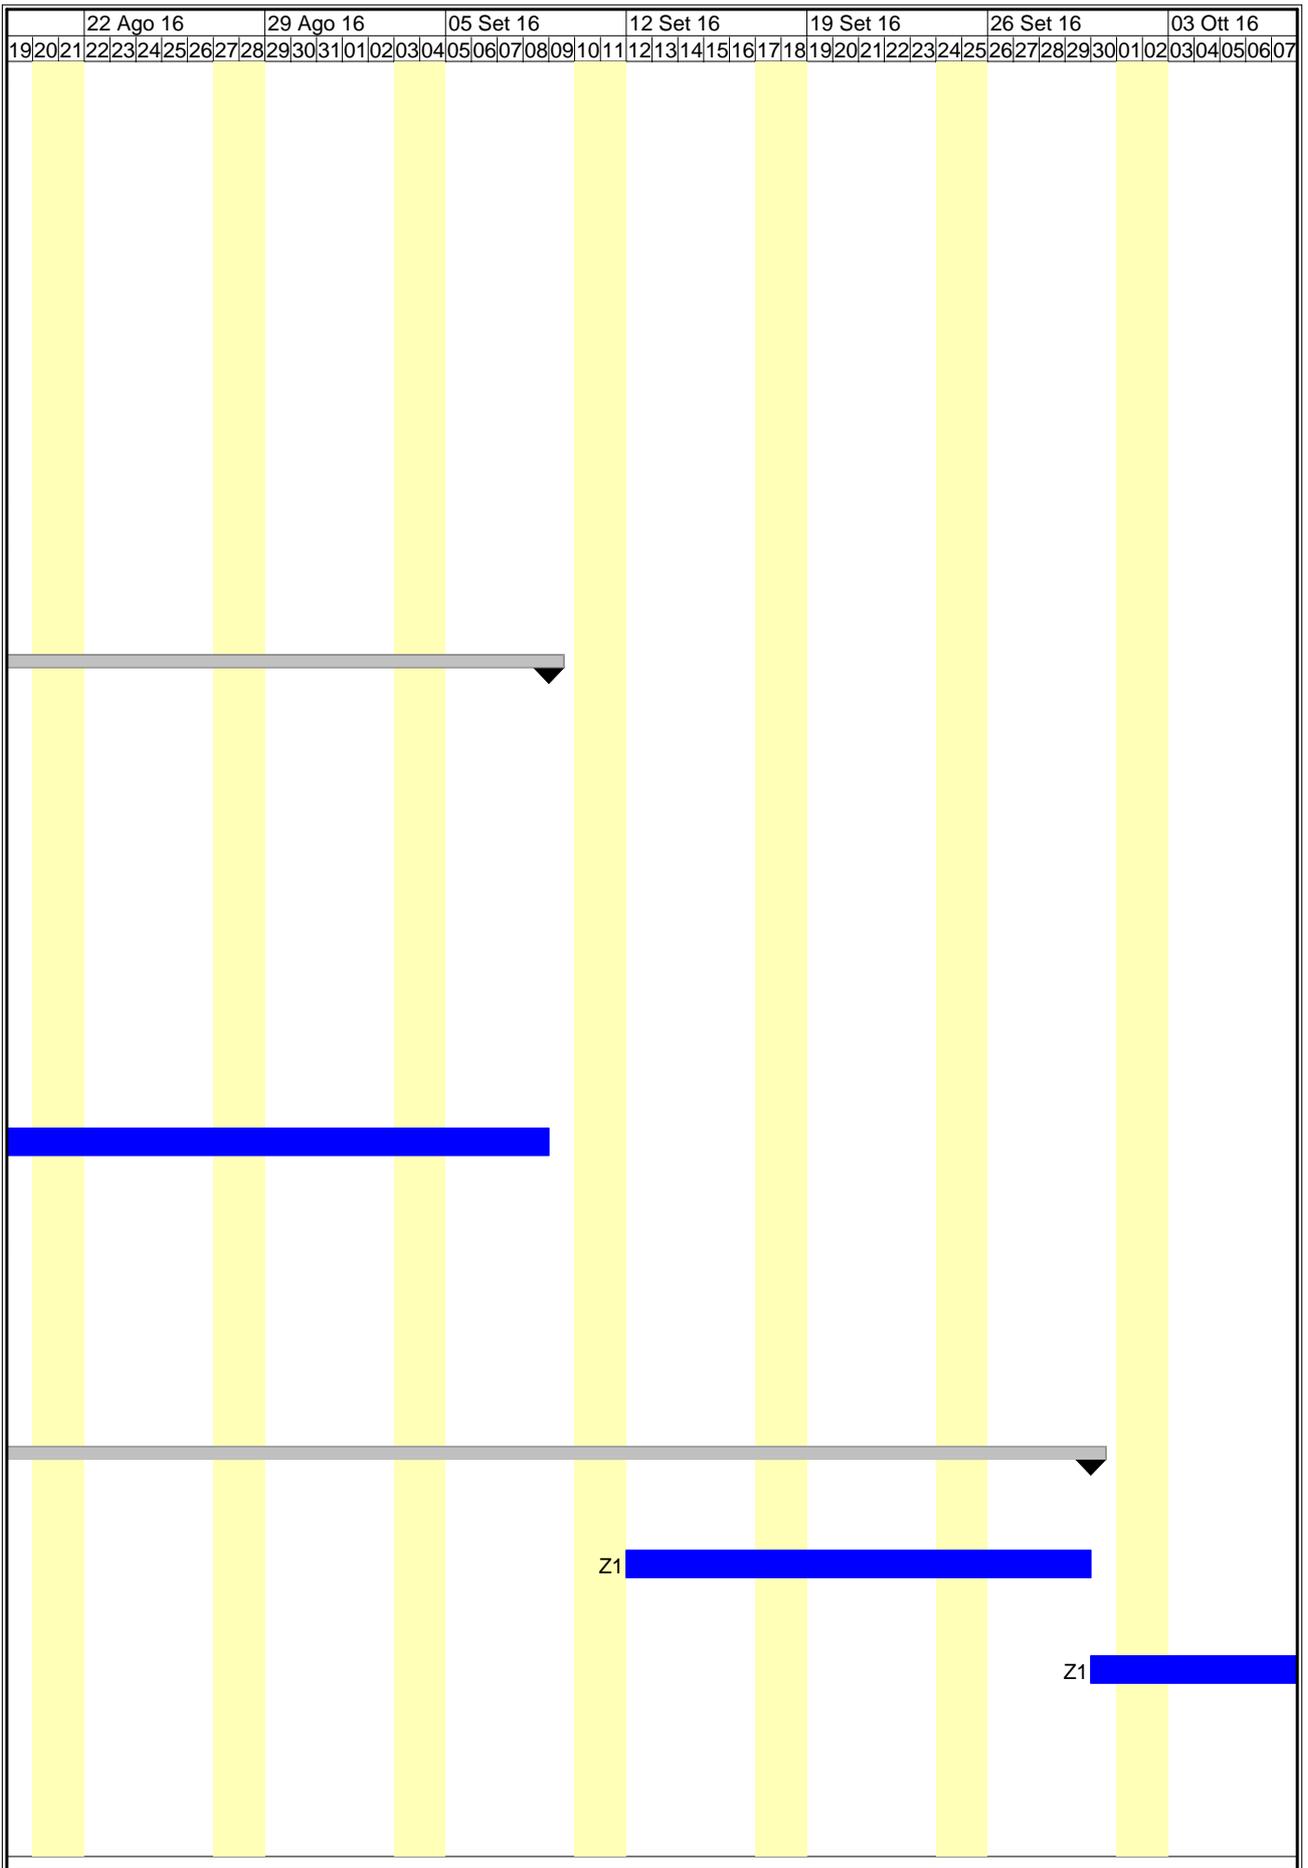

22 Ago 16			29 Ago 16			05 Set 16			12 Set 16			19 Set 16			26 Set 16			03 Ott 16																															
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07



