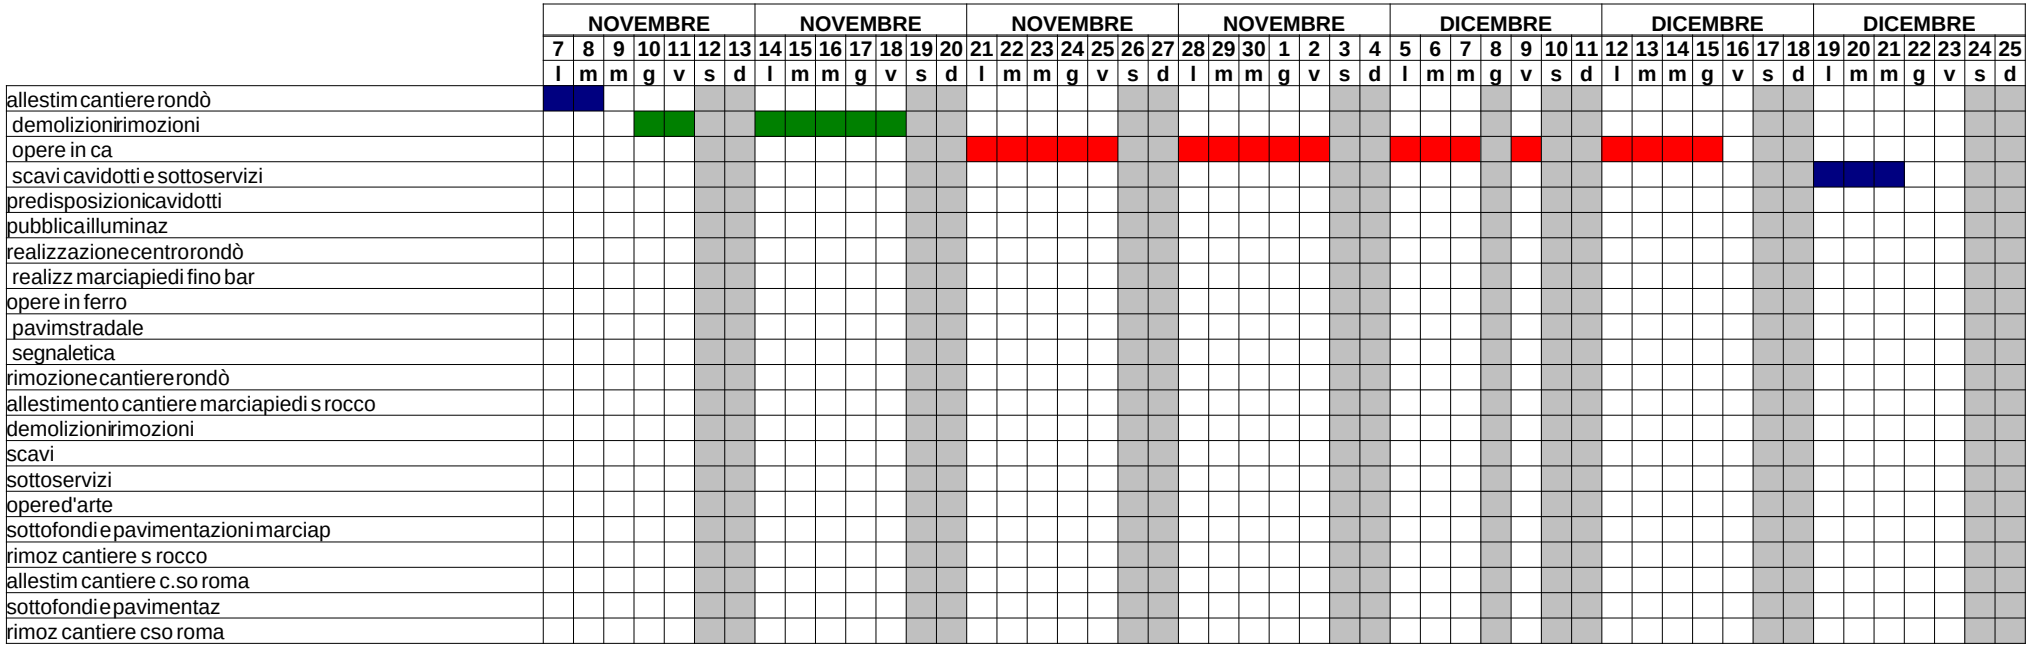
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
DICEMBRE
DICEMBRE
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
allestim cantiere rondò
demolizioni rimozioni
opere in ca
scavi cavidotti e sottoservizi
predisposizioni cavidotti
pubblica illuminaz
realizzazione centro rondò
realizz marciapiedi fino bar
opere in ferro
pavim stradale
segnaletica
rimozione cantiere rondò
allestimento cantiere marciapiedi s rocco
demolizioni rimozioni
scavi
sottoservizi
opere d'arte
sottofondi e pavimentazioni marciap
rimoz cantiere s rocco
allestim cantiere c.so roma
sottofondi e pavimentaz
rimoz cantiere cso roma

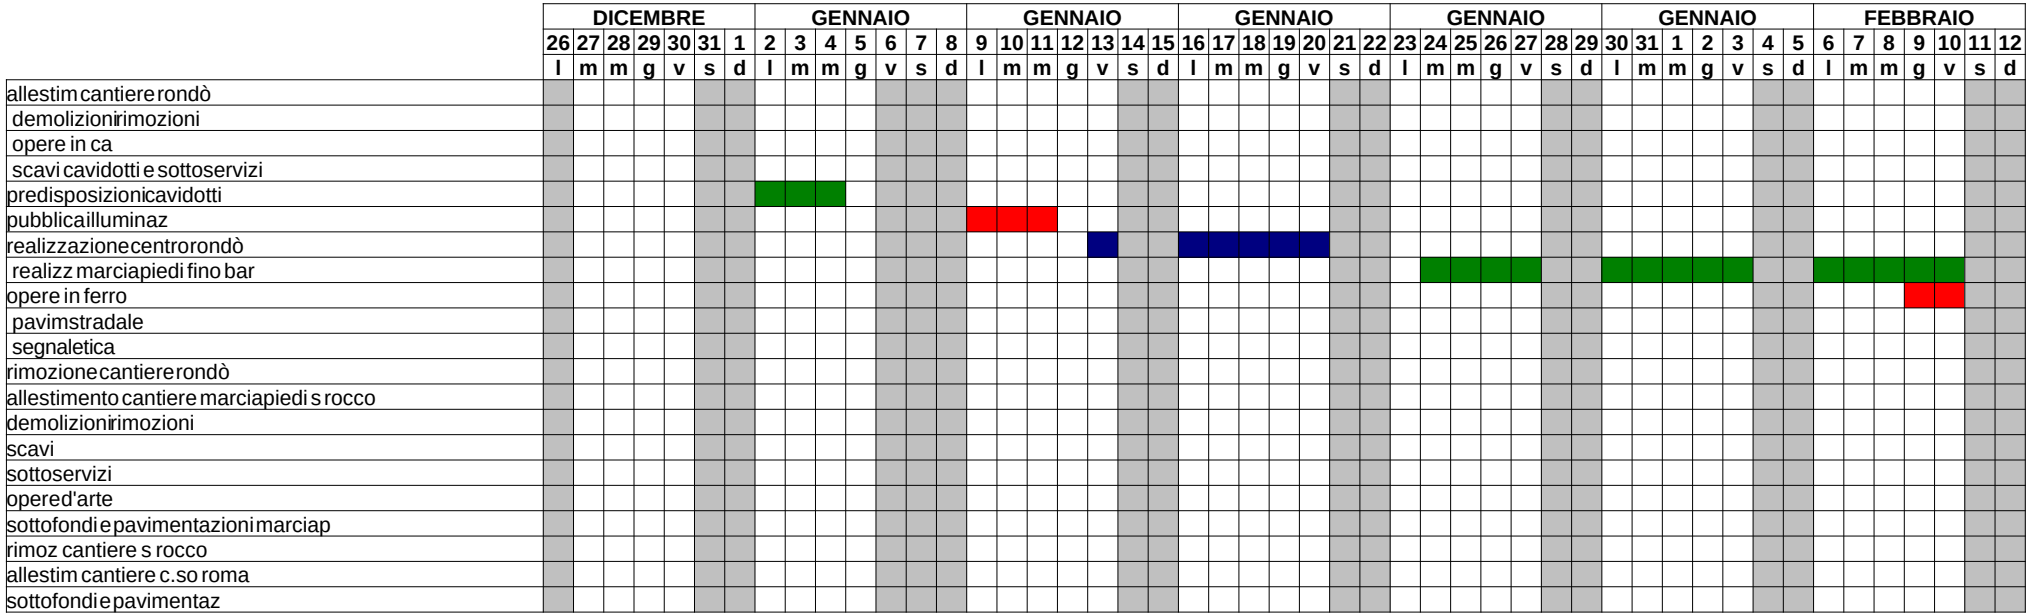
DICEMBRE
GENNAIO
GENNAIO
GENNAIO
GENNAIO
GENNAIO
FEBBRAIO
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
allestim cantiere rondò
demolizioni rimozioni
opere in ca
scavi cavidotti e sottoservizi
predisposizioni cavidotti
pubblica illuminaz
realizzazione centro rondò
realizz marciapiedi fino bar
opere in ferro
pavim stradale
segnaletica
rimozione cantiere rondò
allestimento cantiere marciapiedi s rocco
demolizioni rimozioni
scavi
sottoservizi
opere d'arte
sottofondi e pavimentazioni marciap
rimoz cantiere s rocco
allestim cantiere c.so roma
sottofondi e pavimentaz

	DICEMBRE							GENNAIO							GENNAIO							GENNAIO							GENNAIO							GENNAIO							FEBBRAIO						
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
rimoz cantiere cso roma																																																

	FEBBRAIO							FEBBRAIO							FEBBRAIO							MARZO							MARZO							MARZO							MARZO						
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
allestim cantiere rondò																																																
demolizioni rimozioni																																																
opere in ca																																																
scavi cavidotti e sottoservizi																																																
predisposizioni cavidotti																																																
pubblica illuminaz																																																
realizzazione centro rondò																																																
realizz marciapiedi fino bar																																																
opere in ferro																																																
pavim stradale																																																
segnaletica																																																
rimozione cantiere rondò																																																
allestimento cantiere marciapiedi s rocco																																																
demolizioni rimozioni																																																
scavi																																																
sottoservizi																																																
opere d'arte																																																
sottofondi e pavimentazioni marciap																																																
rimoz cantiere s rocco																																																
allestim cantiere c.so roma																																																
sottofondi e pavimentaz																																																
rimoz cantiere cso roma																																																

	APRILE							APRILE							APRILE							APRILE							APRILE							MAGGIO							MAGGIO						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
allestim cantiere rondò																																																
demolizioni rimozioni																																																
opere in ca																																																
scavi cavidotti e sottoservizi																																																
predisposizioni cavidotti																																																
pubblica illuminaz																																																
realizzazione centro rondò																																																
realizz marciapiedi fino bar																																																
opere in ferro																																																
pavim stradale																																																
segnaletica																																																
rimozione cantiere rondò																																																
allestimento cantiere marciapiedi s rocco																																																
demolizioni rimozioni																																																
scavi																																																
sottoservizi																																																

	APRILE							APRILE							APRILE							APRILE							APRILE							MAGGIO							MAGGIO						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
opered'arte																																																	
sottofondi e pavimentazioni marciap																																																	
rimoz cantiere s rocco																																																	
allestim cantiere c.so roma																																																	
sottofondi e pavimentaz																																																	
rimoz cantiere cso roma																																																	
